



校舍擴建工程進度簡訊(2022年3月)


擴建工程執行小組

A. 工程進度概況

走進 2022 年，施工團隊全力推進新校舍的外牆施工、機電設備安裝，以及室內裝修等工序。惜農曆新年前珠海新一波的疫情變化，以及香港近月的嚴峻疫情，再次對工程進度帶來了影響。因此，校方與施工團隊繼續加強溝通，透過每周兩次常規會議，商討所需的應變策略，盡力爭取新學年前完成第一期校舍擴建工程。

現時，新中學部教學樓已全面進行室內外裝飾裝修，以及機電系統設備的安裝。外牆飾面部份已完成 70%以上，預計 4 月內完成後即啟動拆棚工作。新小學部大樓上蓋結構正爭取 3 月內完成，現時同步開展泥水裝修和機電預埋安裝工作。

B. 地盤施工階段圖片

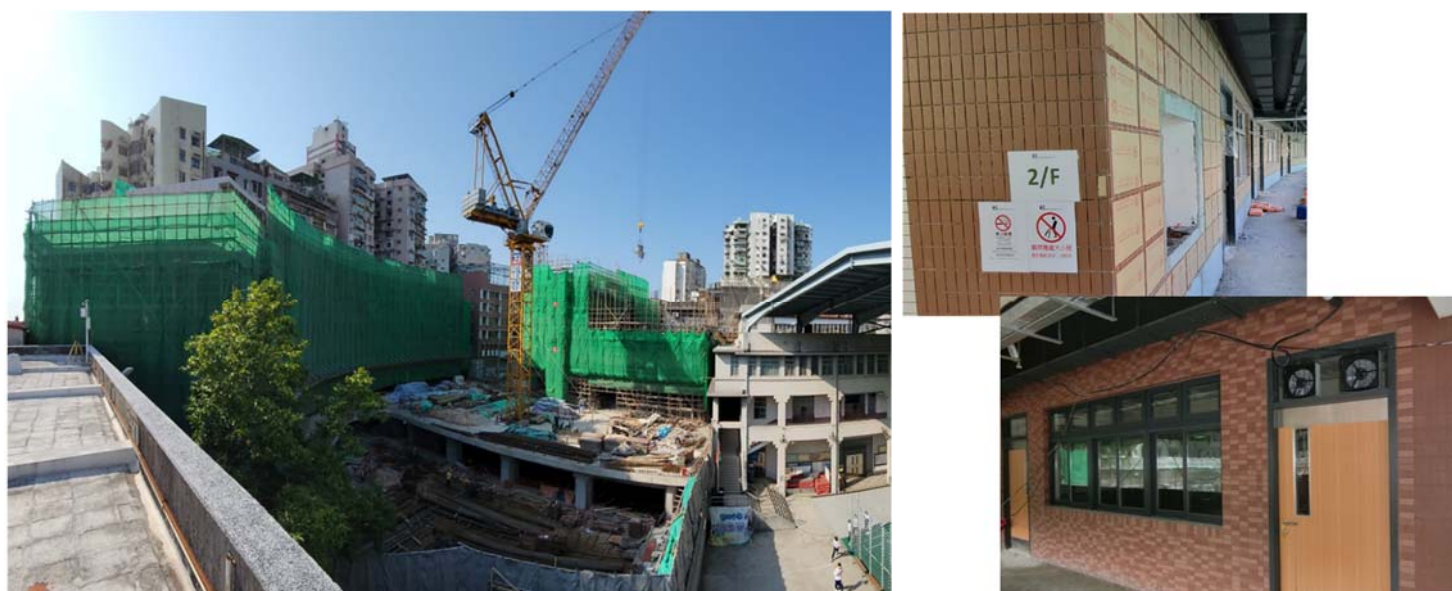

C. 第一期工程竣工建築圖

