



校舍擴建工程進度簡訊(2021年3月)

擴建工程執行小組

A. 工程進度概況

澳門慈幼中學校舍擴建工程計劃，校方經過多年的努力，積極與相關政府部門討論及協調，並獲得教青局及澳門基金會的大力支持，擴建工程資助申請於2019年12月獲批；第一期的拆卸工程於2020年5月完成，現階段樁基礎及支護樁已基本完成；並正進行地基及地庫開挖、地庫防水、樁承台、地樑、地庫樓板建造、排水及機電管網預埋安裝等工程。

按現時的進度預計，第一期工程將於2022年3月份完成，其後進行政府部份驗收及校舍搬遷工作，相關驗收範圍包括：小學部新建教學及行政大樓，內有各功能室及相應設施，中學部其中一棟新建教學大樓，內有基本的教學設施。第一期工程完成的各項設施設備，預計於2022年9月份，可供全中、小學部師生使用。


為配合工程的跟進工作，校方組織了校舍擴建工程執行小組，由校長帶領，連同中、小學部共11人組成，逢周二早上舉行小組會議，下午由代表出席地盤工作會議，對工程進度及質量作出了解、監督及反映意見，以確保工程期間之空氣、噪音能符合環保局及教與學之要求，亦能保障師生安全進出校園，俾讓全校師生都能在安全的校園環境下進行教與學活動。現時，執行小組正檢視第一期工程的設備傢俱需求，搬遷計劃方案和第二期工程期間的地盤及學校的運作流程等。

工程進行期間，還需要各持份者的包容與忍耐、適應與配合……






B.地盤施工階段圖片

1. 拆卸階段：

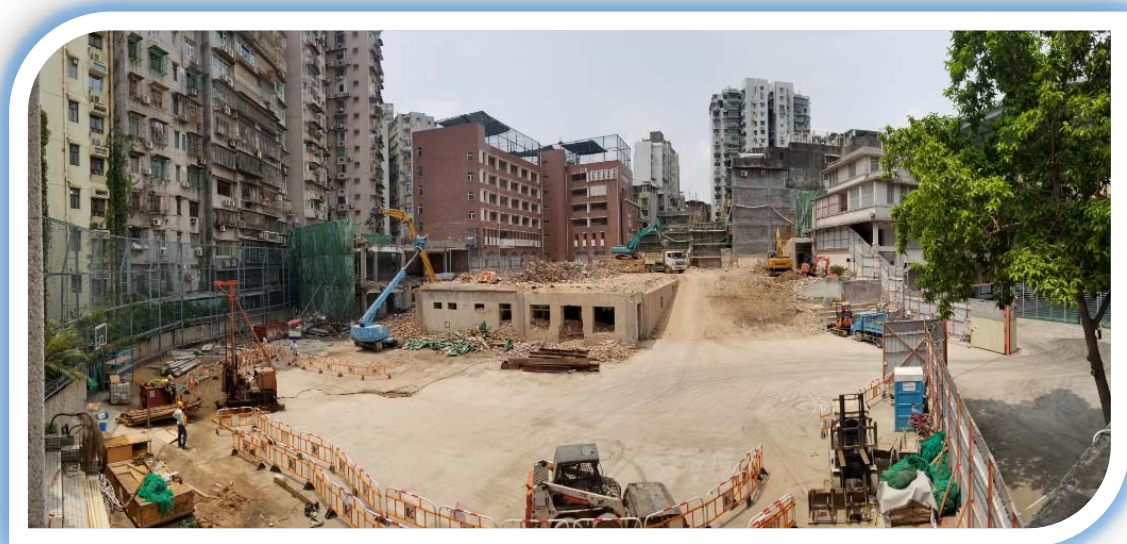



2. 基樁及地庫開挖階段：

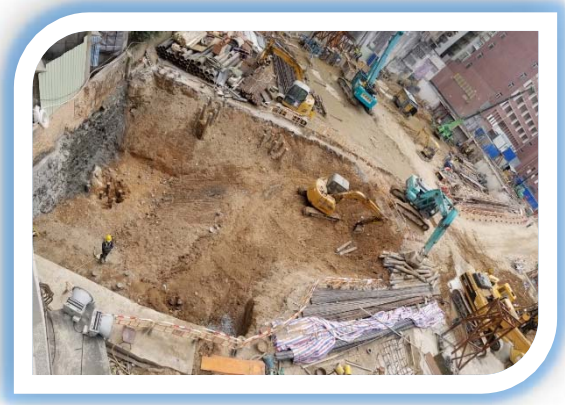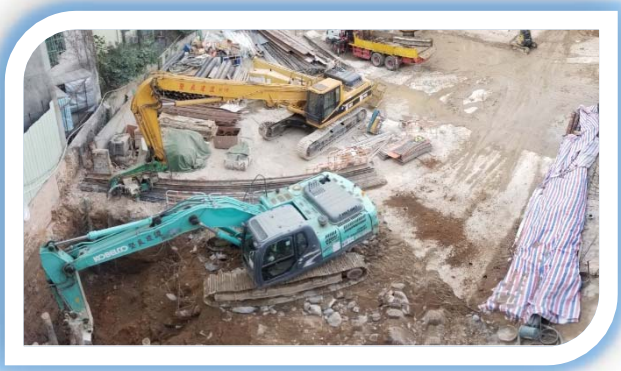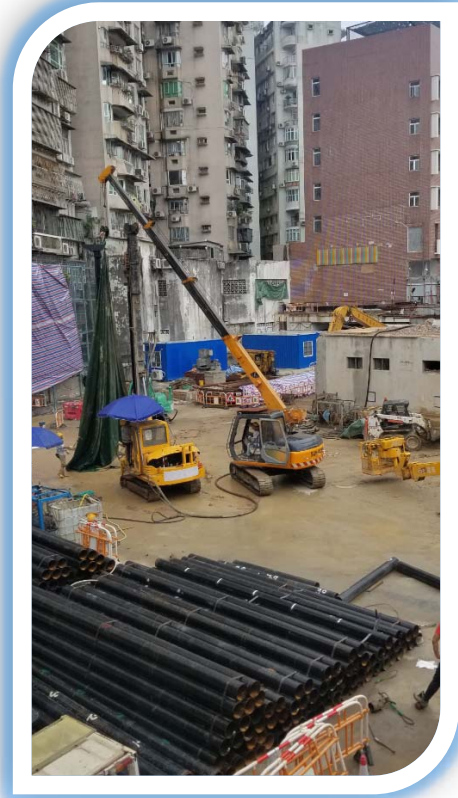



3. 地庫及樓層結構建造階段：

